

SPRINT 3

Roles del equipo

El Product Owner (PO) en esta oportunidad fue Valentin, mientras que el rol de Scrum Master (SM) fue desempeñado por Nicolas. Jose asumió la responsabilidad de QA Engineer, y el equipo de desarrollo estuvo compuesto por Tomas, Camila e Ignacio.

Actas de reuniones

En la sesión de planeamiento, se estableció un Sprint Goal orientado a la gestión integral de turnos. Ante la necesidad de superar la desorganización de ciclos anteriores, el equipo tomó la decisión estratégica de abandonar la especialización estricta por capas (backend/frontend) para adoptar un modelo de trabajo *end-to-end*. Bajo esta nueva dinámica, cada desarrollador asumió la responsabilidad total de una historia de usuario, abarcando desde la lógica de base de datos hasta la interfaz gráfica. Para asegurar la cohesión sin bloqueos, se documentaron contratos de *endpoints* de manera exhaustiva y se integró un diagrama de entidad-relación como mapa de ruta común, acompañando estas definiciones con el *Planning Poker* para una estimación precisa de *Story Points*.

Métricas y artefactos

Objetivo del Sprint: Gestión completa del ciclo de turnos.


Estado: Se completaron satisfactoriamente todas las historias comprometidas.

Seguimiento: Por primera vez, el equipo mantuvo la disciplina colectiva de mover las tarjetas de forma progresiva en el tablero Kanban. Esto permitió obtener métricas fiables y un gráfico de *Burndown* que refleja la realidad del progreso del sprint.

Trabajo pendiente en el sprint



36 puntos completados, 0 puntos restantes

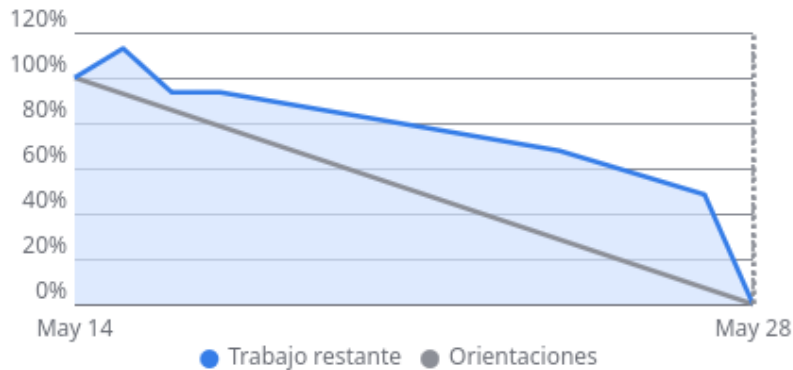

El alcance de tu sprint ha aumentado en 5 puntos



Añadida
+1 punto

↑ 22 actividades

Eliminada
0 puntos

↓ 0 actividades

Modificada
+4 puntos

⚠ 1 actividad

Registros de impedimentos

- **Adaptación al modelo *Full-Stack*:** A El cambio de modalidad exigió que algunos integrantes operaran en capas del proyecto ajenas a su especialidad habitual, lo cual representó un desafío de aprendizaje inicial.
- **Ajustes de diseño de datos:** Aunque el diagrama de base de datos fue una herramienta útil, la implementación práctica reveló la necesidad de cambios imprevistos en la estructura de datos para soportar flujos lógicos complejos, afectando el ritmo inicial.
- **Coordinación de horarios:** La dificultad para sostener ventanas de tiempo comunes fuera del horario de clases para resolver problemas técnicos complejos se mantuvo como el factor limitante principal.

Retrospectiva, análisis de eficiencia

La transición al trabajo por historias de usuario completas resultó un éxito rotundo. Este enfoque elimina las dependencias cruzadas y el tiempo de espera entre capas, incrementando drásticamente la autonomía de los desarrolladores y el entendimiento global del sistema. La definición previa de *endpoints* y el diagrama de base de datos facilitaron la estructuración del desarrollo, demostrando que contar con herramientas visuales reduce la ambigüedad, aun cuando la realidad técnica obliga a iterar sobre los diseños.

Evaluación de acciones de mejora (SPRINT 2 AL 3)

- **Institucionalización de reuniones:** Se mejoró significativamente la comunicación, permitiendo una gestión más ágil.
- **Sincronización sectorial:** La adopción del modelo *end-to-end* hizo obsoleta la división por áreas, integrando naturalmente las responsabilidades.
- **Documentación dinámica:** La creación de contratos de *endpoints* y el mapa de base de datos fueron piezas clave para el avance exitoso.
- **Gestión de Tablero:** Se logró la meta de registrar el avance de forma progresiva, resultando en métricas transparentes y un control real del proyecto.

Acciones de mejora en el sprint 4

- **Notificación temprana de cambios:** Establecer un protocolo de aviso inmediato al equipo ante cualquier modificación requerida en el diseño de base de datos o entidades, evitando conflictos al realizar los *merges*.
- **Revisiones de código transversales:** Implementar revisiones rápidas entre historias para garantizar la uniformidad en los patrones arquitectónicos y la consistencia en los estilos visuales de la aplicación.
